

RECOMENDACIONES

IDENTIFÍQUESE

Al ingresar a la sesión del WEBINAR identifíquese con:

- **Nombre y Apellido**
- **Nombre de la empresa**




ACCESO

El Link de **acceso** del WEBINAR ha sido proporcionado a personas/empresas registradas.

ATENCIÓN

Al ingresar, su micrófono y cámara deberán estar **Desactivados**



PARTICIPACIÓN

Las preguntas deben ser enviadas al correo de informes.sullana@roggio.com.pe
Éstas serán atendidas en nuestro portal de licitaciones.



SEGUNDO WEBINAR

Pre-Calificación de Postores: Licitación Paquete de Construcción N° 01 - Dren Boquerón de Núñez

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SULLANA - BELLAVISTA, EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA



AGENDA

01

TITULAR DEL PROYECTO

02

BENITO ROGGIO E HIJOS SUCURSAL PERÚ

03

ALCANCE DEL PROYECTO

04

PAQUETE DE CONSTRUCCIÓN N°01

05

ESTRATEGIA DE PROCURA

5.1. Principios del proceso de procura

5.2. Etapas del proceso de procura

5.3. Etapa de Precalificación - Requisitos de participación para postores.

5.4. Medios de información y difusión

1. TITULAR DEL PROYECTO



PERÚ

Presidencia
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la
Reconstrucción Con Cambios



Gobierno del Perú



AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Proyecto

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SULLANA - BELLAVISTA, EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA”

Ing. Edward Contreras Sanabria

Gerente de Proyecto ARCC – Drenaje Pluvial Sullana

Dirección de Articulación de Inversiones



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

La Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios- ARCC fue creada para Implementar el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), así restituir toda la infraestructura física dañada por el Fenómeno de El Niño Costero en 13 regiones del país.

Nuestra visión es restituir el bienestar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos afectados por el Fenómeno del Niño brindándoles infraestructura y servicios de calidad en salud, educación, pistas y veredas, saneamiento, agricultura, transportes y soluciones integrales como drenajes pluviales.



ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL PIRCC - Plan Integral de Reconstrucción con Cambios


ARCC como financiador de proyectos

ARCC monitorea la ejecución de las obras luego de realizar las transferencias a las entidades ejecutoras de los tres niveles de gobierno (Nacional, regional y local)




Salud

Transportes



Agricultura

Saneamiento



Educación


Pistas y veredas



ARCC como ejecutor de obras

ARCC actúa como ejecutor de obras de gran envergadura y de impacto para la sociedad

Ejecución de obras de prevención por ARCC mediante acuerdo de Gobierno a Gobierno



Las soluciones integrales de 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales en ciudades de la costa.


Ejecución de obras de reconstrucción por ARCC mediante acuerdo de Gobierno a Gobierno



La reconstrucción de infraestructura en los sectores Salud (15 establecimientos de salud) y Educación (74 locales escolares).

CONTRATO GOBIERNO A GOBIERNO (G2G)

En julio de 2020 el Gobierno peruano firmó un convenio con el Gobierno de Reino Unido e Irlanda del Norte, con el propósito de ejecutar un determinado número de intervenciones enlistadas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios o PIRCC, mediante eficiencia, transparencia y buenas prácticas internacionales.

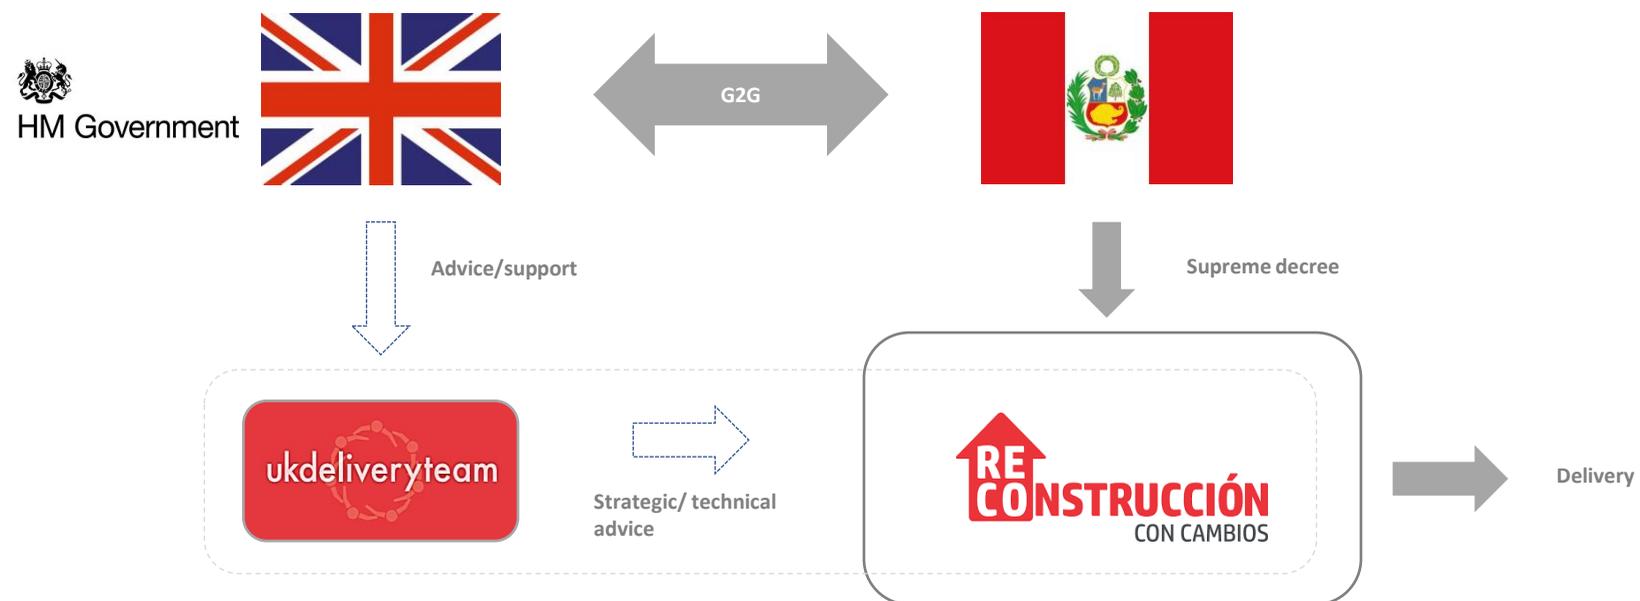



PERÚ

Presidencia
Del Consejo de Ministros

Autoridad para la
Reconstrucción Con Cambios



CONTRATO GOBIERNO A GOBIERNO (G2G)

- *Los acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G) son herramientas colaborativas entre países, que permiten lograr una ejecución de proyectos más eficiente.*
- *El Gobierno extranjero pone en marcha distintas buenas prácticas y experiencias de éxito, a través de la transferencia del conocimiento durante todas sus etapas.*



2. | **BENITO ROGGIO E HIJOS
SUCURSAL PERÚ**

NOSOTROS

Inicio de Actividades: **1908**

Benito Roggio inició sus actividades en el año **1908** y lo transitamos **creciendo** con **esfuerzo** y **responsabilidad**.

Somos el corazón del Grupo Roggio, un holding que desarrolla proyectos y los ejecuta en diversos ámbitos.

MÁS DE
750 PROYECTOS
EJECUTADOS

Normas ISO certificadas:

9001:2015


Calidad

14001:2015

Gestión ambiental

45001:2018

Seguridad y Salud en el Trabajo

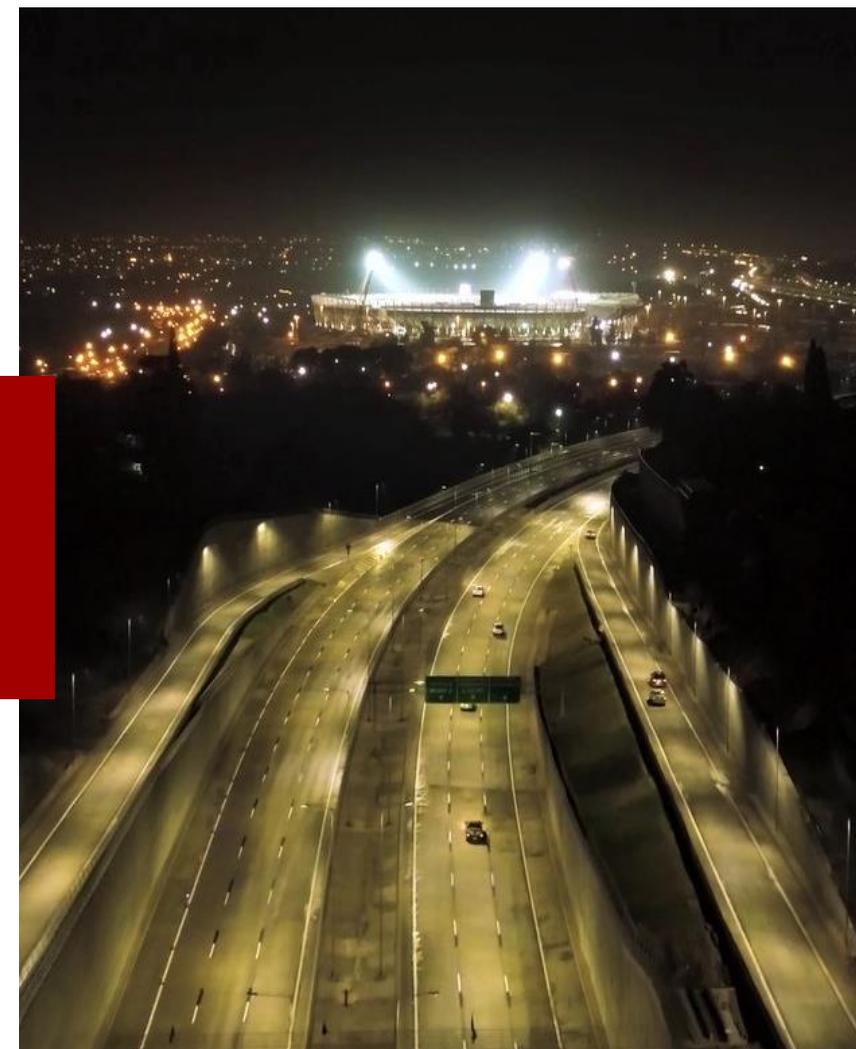

NOSOTROS

Tenemos más de un siglo apostando por el desarrollo y la evolución

- **Proyectamos** el crecimiento, sostenidos por la responsabilidad para asumir nuevos compromisos y generar credibilidad.
- **Disfrutamos** del liderazgo en las áreas de construcción, ingeniería e implementación de nuevos servicios.
- **Ofrecemos** soluciones integrales, desde la capacidad y experiencia para cumplir con las expectativas de los clientes.



ALCANCE REGIONAL

Desarrollamos ingeniería de vanguardia para la Región

Tenemos presencia a nivel regional.

Junto a las asociaciones establecidas con empresas de diferentes países, brindamos la capacidad y experiencia para afrontar los proyectos más exigentes.



NUESTRA EXPERIENCIA



Ingeniería y
construcción




Infraestructura
ferroviaria



Infraestructura
vial



Minería

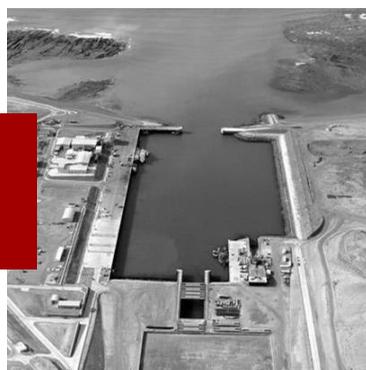

Infraestructura fluvial y
marítima



Agua y
Saneamiento



Drenajes



Energía

COMPROMISO SOCIAL

Roggio en la comunidad

El programa considera diferentes actividades y nos permite construir un vínculo de colaboración e interacción, con las comunidades donde desarrollamos las obras.

Escuelas

CHARLAS
INSTRUCTIVAS



Apoyo

A INSTITUCIONES



Alianzas

CON ORGANIZACIONES



An aerial photograph of a multi-lane highway under construction. The road surface is partially paved and partially dirt. A red rectangular box is overlaid in the center of the image, containing the word "ROGGIO" in white, bold, serif capital letters. Below the box, the text "BENITO ROGGIO E HIJOS S.A." is written in a smaller, black, serif font. The background shows a residential area with houses and trees on the left, and a grassy area with a small pond on the right.

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

3. | ALCANCE DEL PROYECTO


DATOS DEL PROYECTO



La Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC) adjudicó a **Benito Roggio e Hijos S.A. Sucursal Perú** el diseño y la ejecución el proyecto denominado:


“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SULLANA - BELLAVISTA, EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA”

DATOS DEL PROYECTO

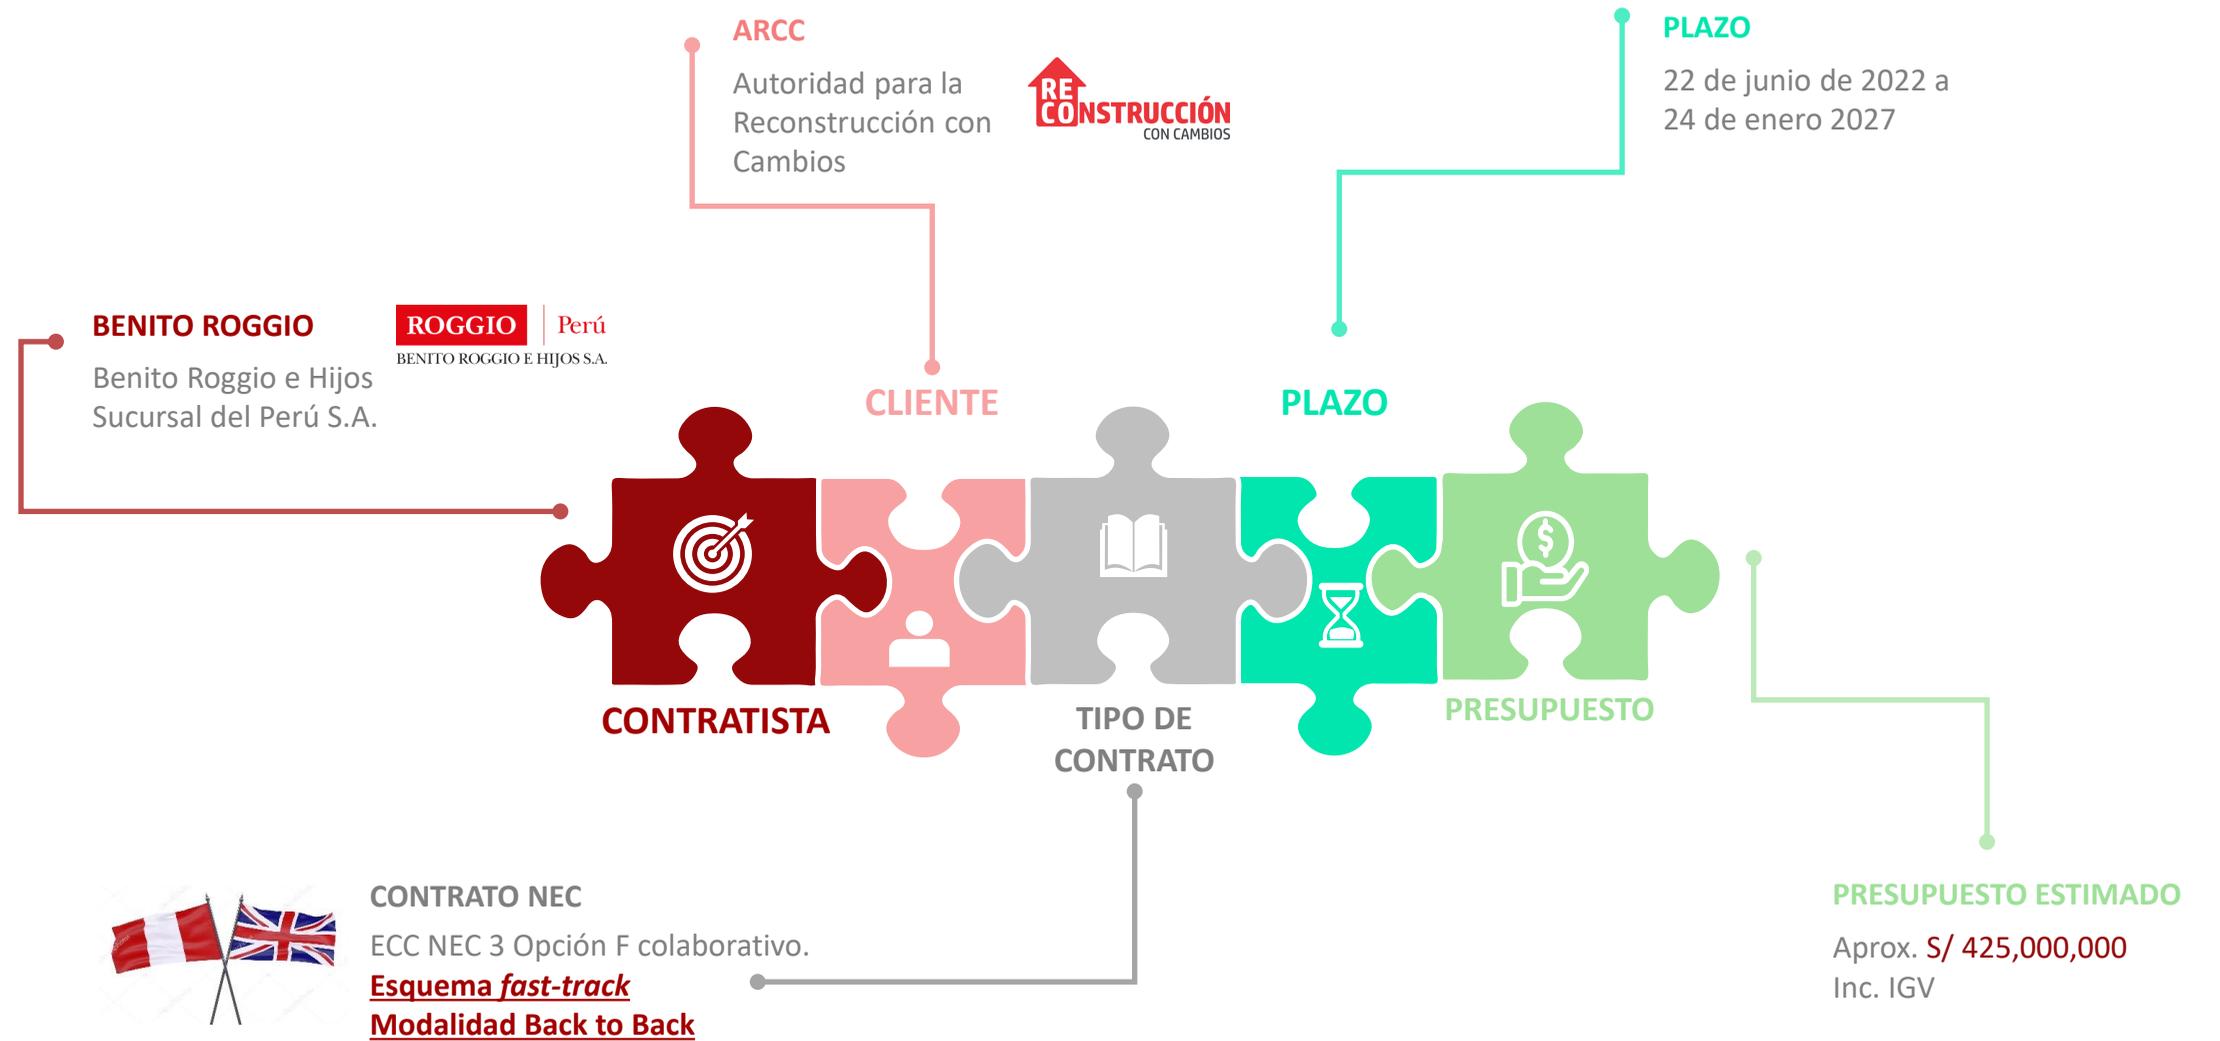


DEL CONTRATO

Bajo el acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) entre el Perú y el Reino Unido, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) firmó el 21 de Junio de 2022 el contrato del Proyecto Entrega del Drenaje de Sullana de Soluciones Integrales (Paquete D05) con BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Sucursal Perú. Cabe destacar que como parte del G2G, el proyecto es adjudicado mediante contrato NEC, es decir, a través de un proceso colaborativo.

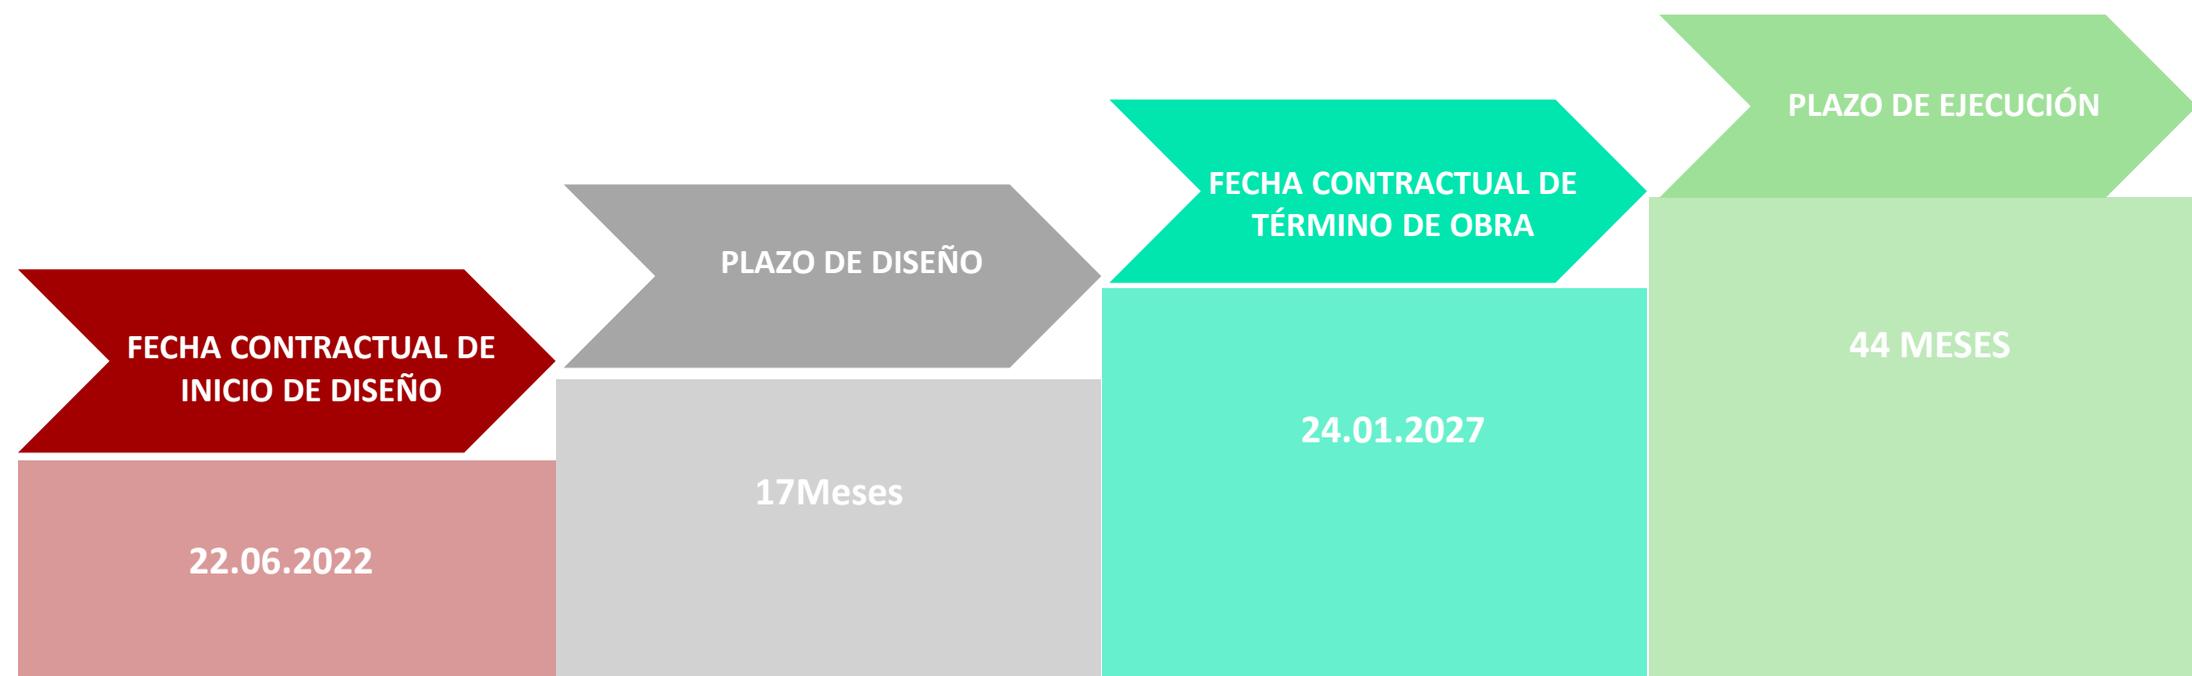


PAQUETES DE CONSTRUCCIÓN

- 1** | **PAQUETE 01**
DREN BOQUERON DE NUÑEZ
- 2** | **PAQUETE 02**
SISTEMA COLA DE ALACRÁN 1
- 3** | **PAQUETE 03**
SISTEMA COLA DE ALACRÁN 2 y 3
- 4** | **PAQUETE 04**
CANAL VÍA

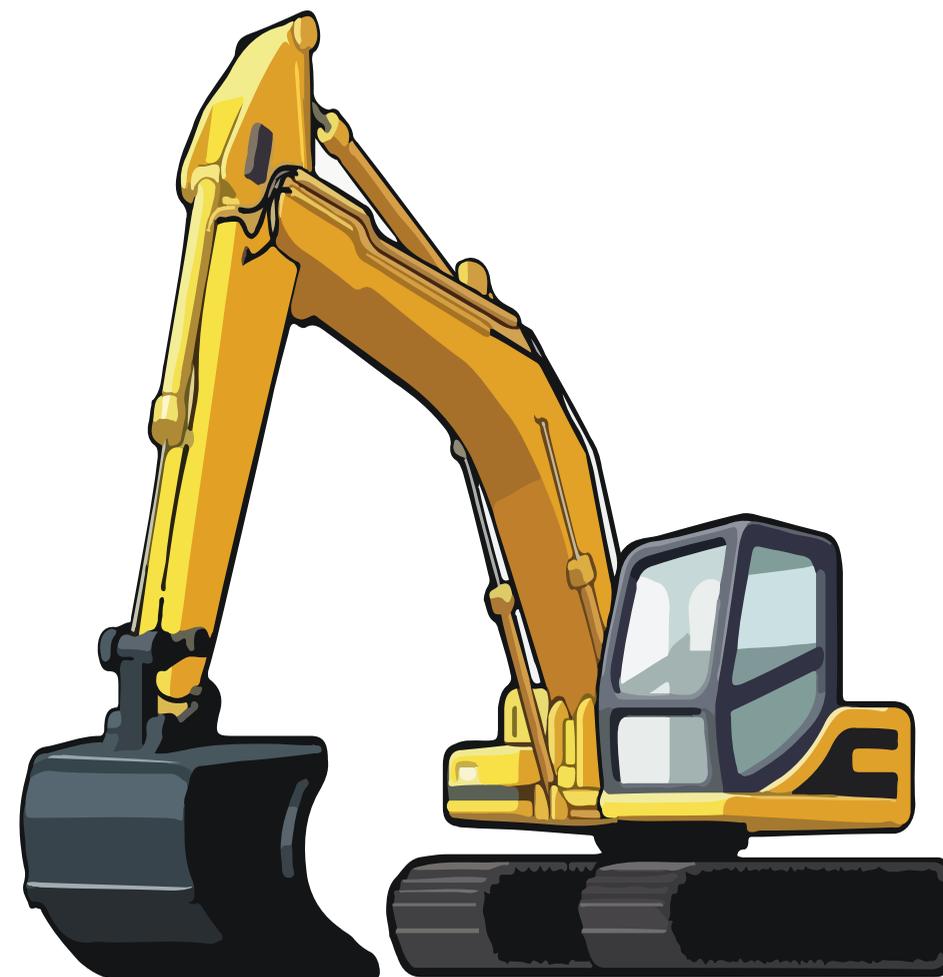

UBICACIÓN DE LOS PAQUETES DEL PROYECTO

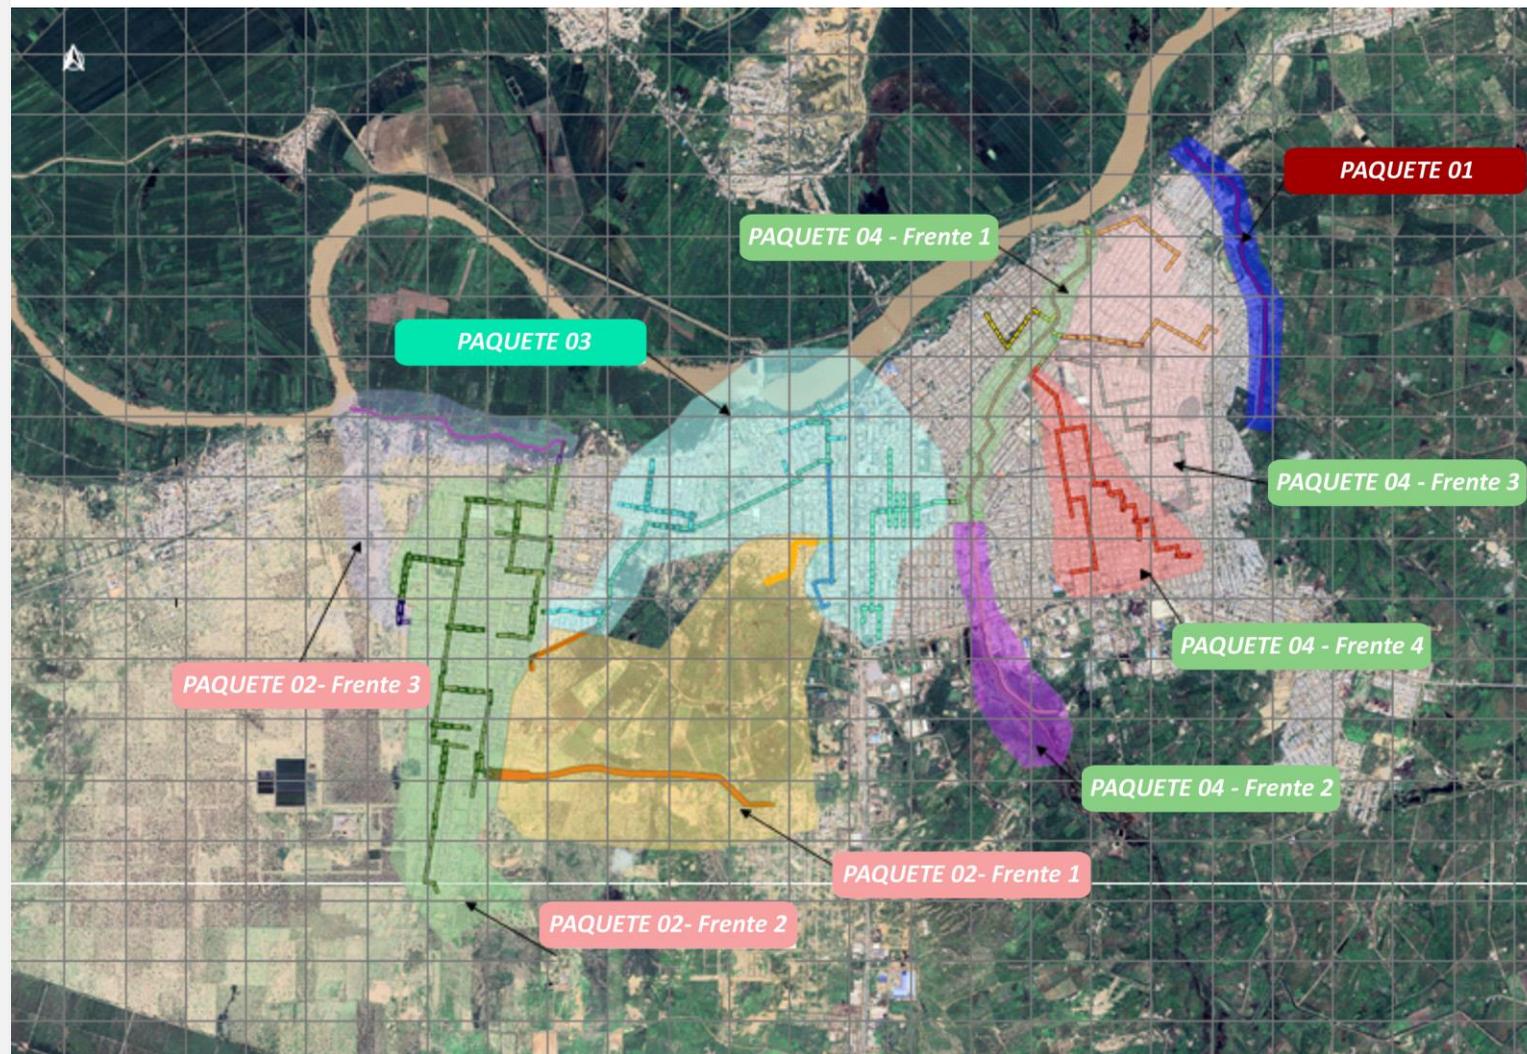

PAQUETES

PAQUETE 01

Frente único

PAQUETE 02

Frente 1

Frente 2

Frente 3

PAQUETE 03

Frente Único

PAQUETE 04

Frente 1

Frente 2

Frente 3

Frente 4

CARACTERÍSTICA DE LA OBRA

Boquerón de Núñez

Canal

Tubería

Cola de Alacrán 1

Canal

Tubería

Canal

Cola de Alacrán 2 y 3

Tubería

Canal Vía

Canal Vía Techado



Canal Vía Sin Techar


Tubería

Tubería

4. | PAQUETE DE
CONSTRUCCIÓN N°01:
DREN BOQUERÓN DE NUÑEZ

UBICACIÓN DEL PAQUETE 01 EN EL PROYECTO

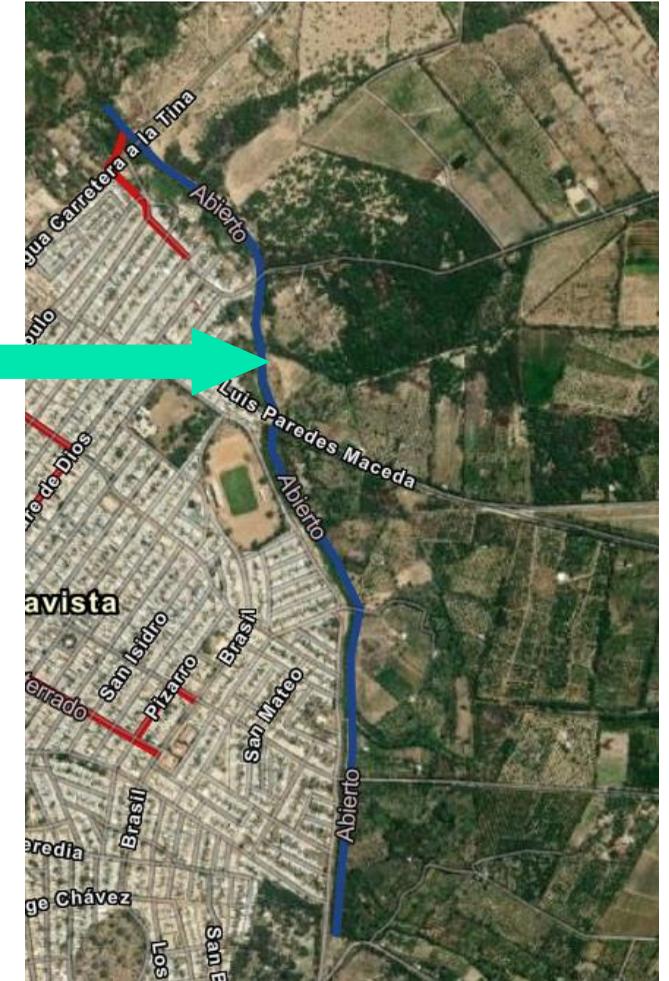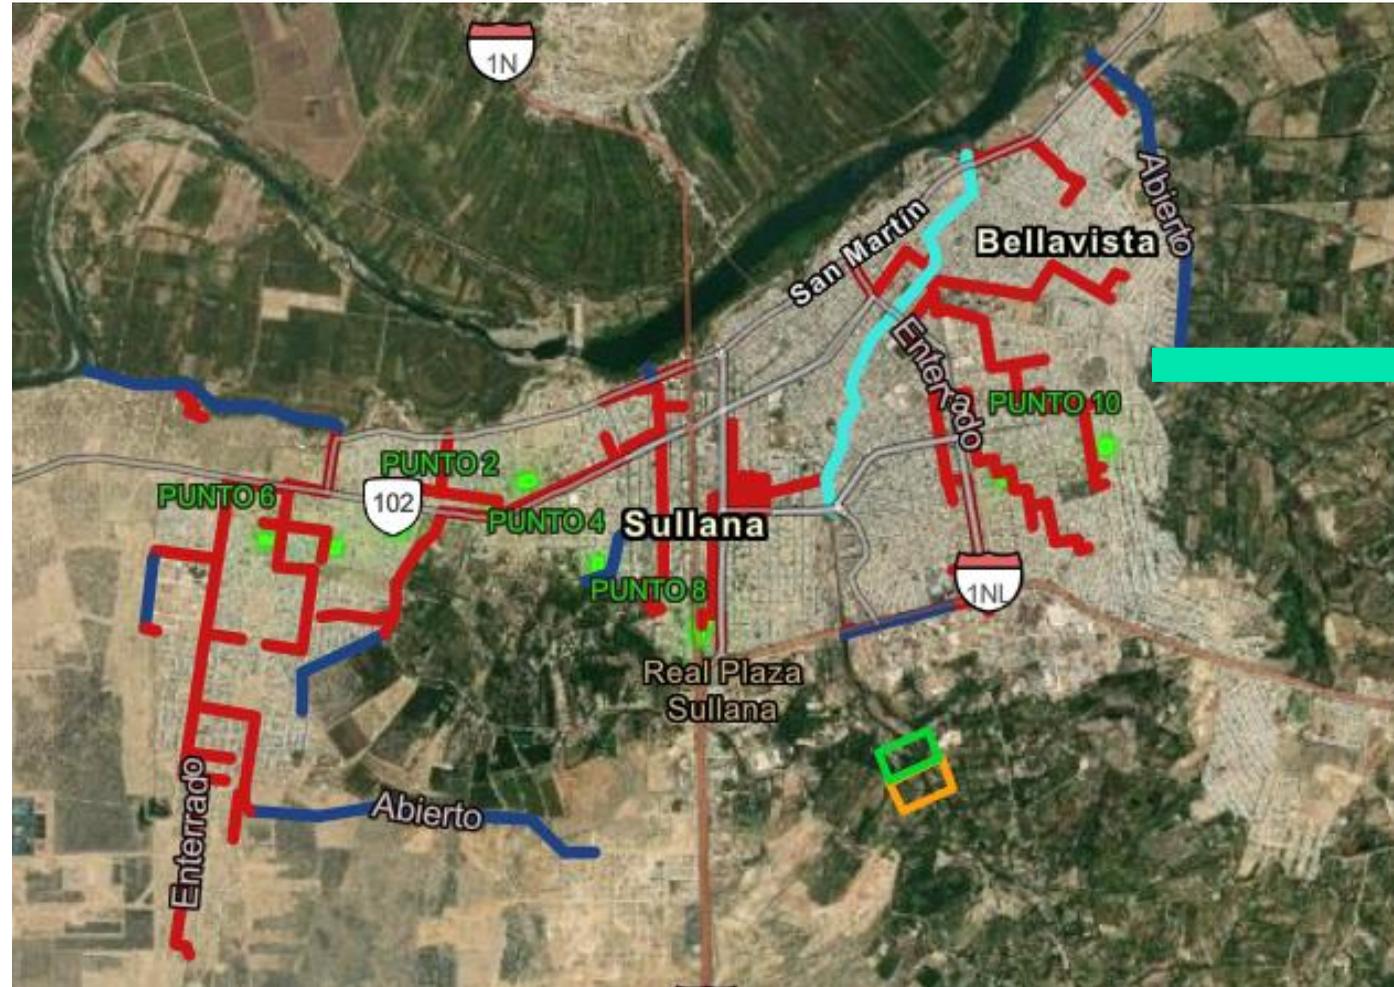

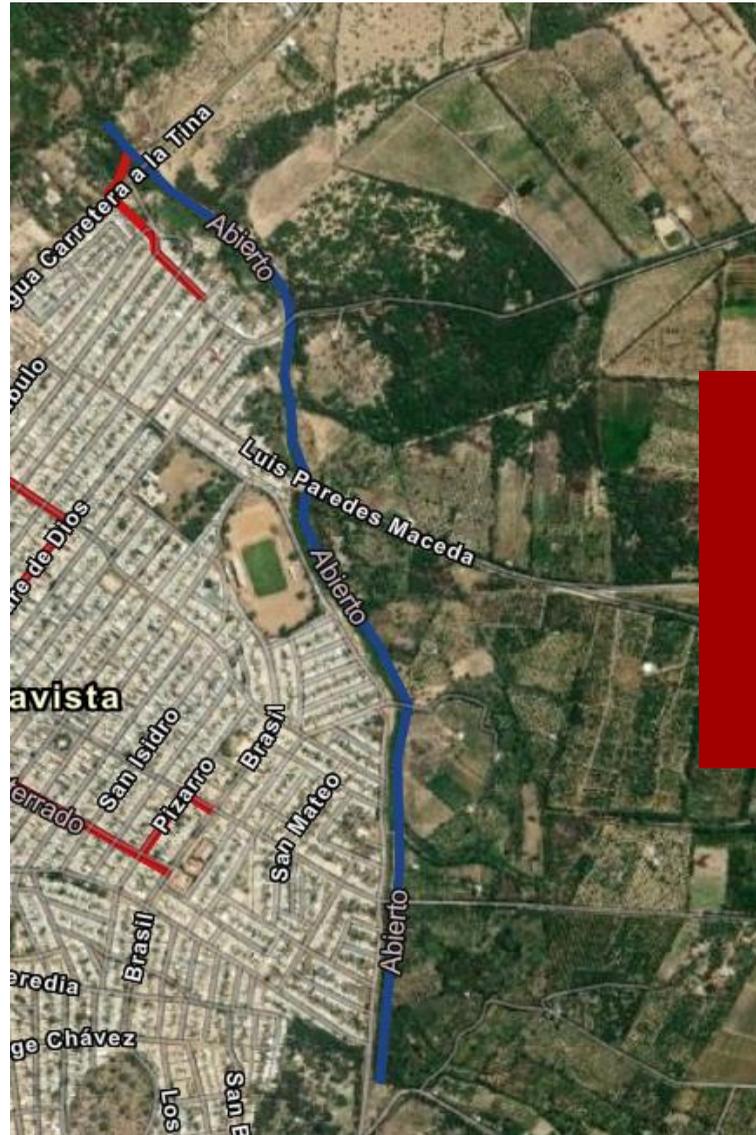


El Paquete 01 , se ubica al límite del distrito de Bellavista.

Se encuentra delimitado por el casco periurbano, la carretera a La Tina, zonas agrícolas y la Quebrada Boquerón de Núñez y Bellavista.

Existencias a cada lado del Dren actual :

- * En el límite periurbano, se encuentra un asentamiento humano con presencia de construcciones muy cercanas al talud del dren.
- * En el lado rural, se observa una extensa área de mosaico agrícola, con paisajes de vegetación silvestre, además de pocas viviendas construidas con materiales precarios.

ESTADO ACTUAL DEL DREN BOQUERÓN DE NUÑEZ

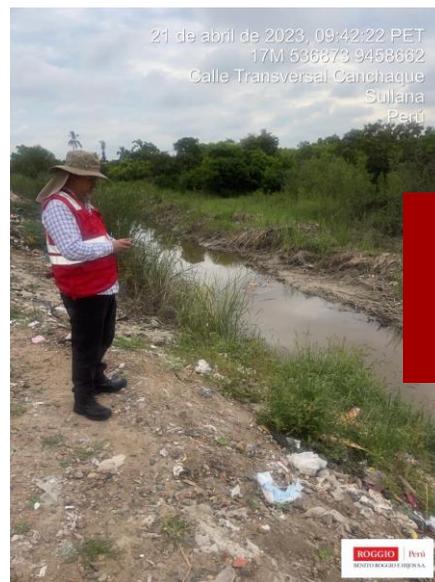

Estado actual

Presenta un dique de construcción provisional que bordea el casco de Bellavista. Dirige sus aguas en sentido sur a norte, proviniendo las mismas de su intersección con la Quebrada Bellavista y quebrada Boquerón . Estas aguas llegan desde las partes más altas del sureste y del este y finalmente desembocan al río Chira.

Existencias a lo largo del dren actual

En todo su recorrido se aprecia un paisaje verde variado con algunas especies como totora, espinillo, y algarrobo. También hay puntos de acopio de basura dispuestos sobre el talud del dren, y otros en el sector rural.

OBRAS A EJECUTAR EN EL PAQUETE 01




PAQUETE 1 DREN BOQUERON DE NUÑEZ



- * 2.30 km de Canal trapezoidal con Banquetas revestido.
- * 0.30 km de Estructura de descarga hacia el río Chira.
- * 04 estructuras de cruce
- * 06 retornos.
- * 03 conexiones a quebradas (Q. Bellavista, Q. Boquerón y Q. Boquerón aguas abajo).
- * 2.40 km de vía pavimentada doble carril (margen izquierda).
- * 0.35 km de Instalación de Tubería de 600 mm.

OBRAS A EJECUTAR EN EL PAQUETE 01


SECCIÓN DREN BOQUERÓN

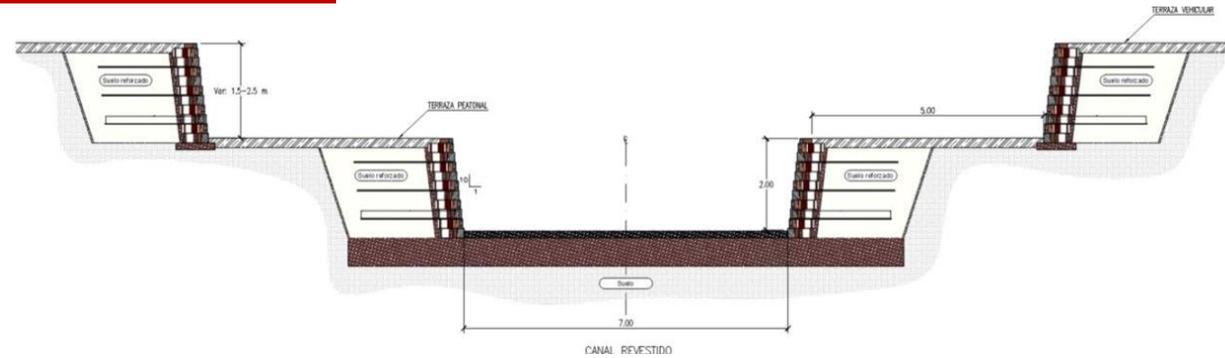


SECCIÓN TÍPICA ALCANTARILLAS

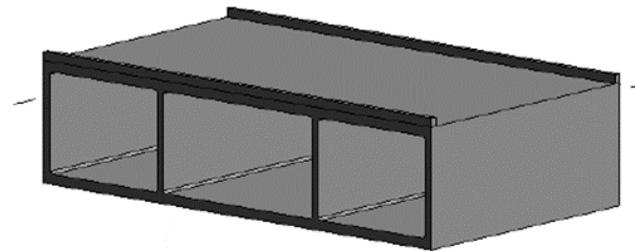





SECCIÓN TÍPICA RETORNOS



ESTRUCTURA DE DESCARGA AL CHIRA - DESDE LA TINA AL RIO CHIRA

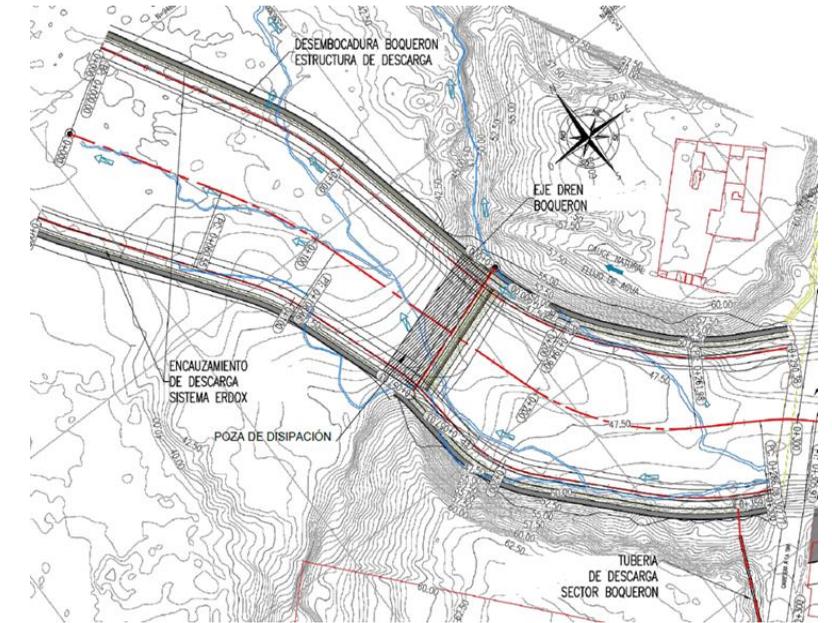

SECCIONES DEL CANAL A EJECUTAR

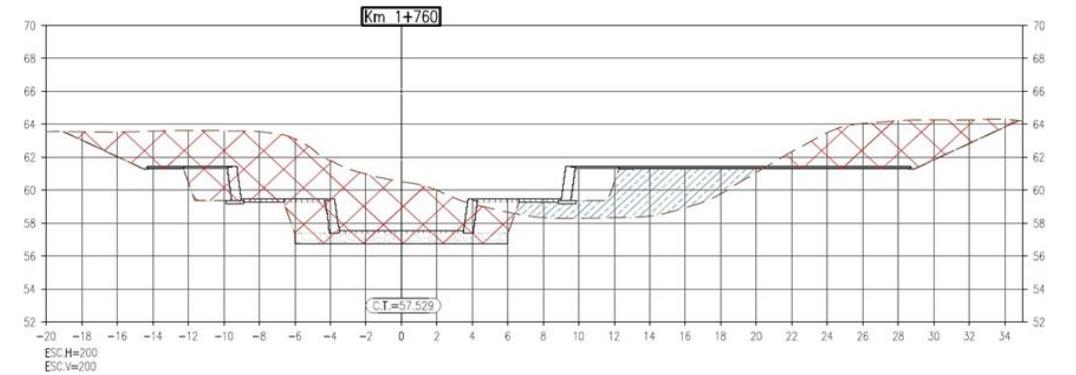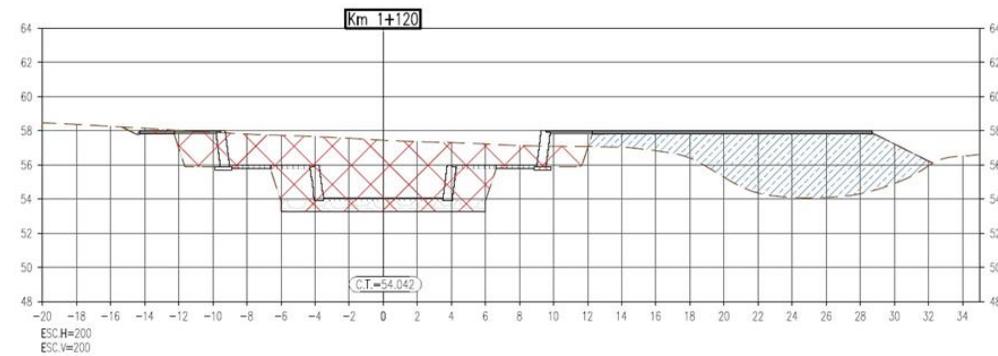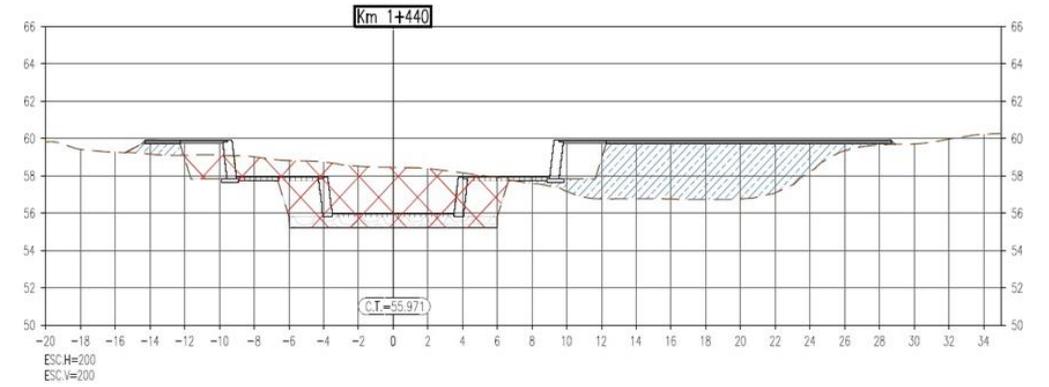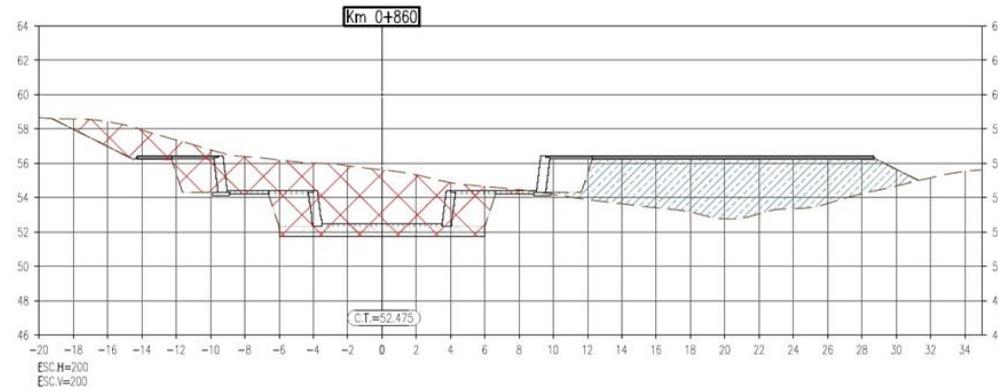

SECCIONES TÍPICAS DE CANAL

MODELO BIM DEL PAQUETE 01

Para una mejor comprensión de los trabajos a ejecutar, se presenta el Modelo BIM para el Dren Boquerón.



Inicia en la
Descarga al Río
Chira y culmina
en la conexión
con el Dren
Bellavista

5. | ESTRATEGIA DE PROCURA

CADENA DE VALOR PARA EL PROCESO DE PROCURA



EL CLIENTE

Entidad responsable por la reconstrucción de la infraestructura física dañada por el fenómeno de El Niño.



EL CONTRATISTA

Empresa transnacional **GESTORA** del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial Integral de la Ciudad de Sullana – Bellavista”.




SUB-CONTRATISTA

Empresa adjudicada con el “**Subcontrato**” de un Paquete de Construcción del Proyecto.



PRINCIPIOS DEL PROCESO DE PROCURA

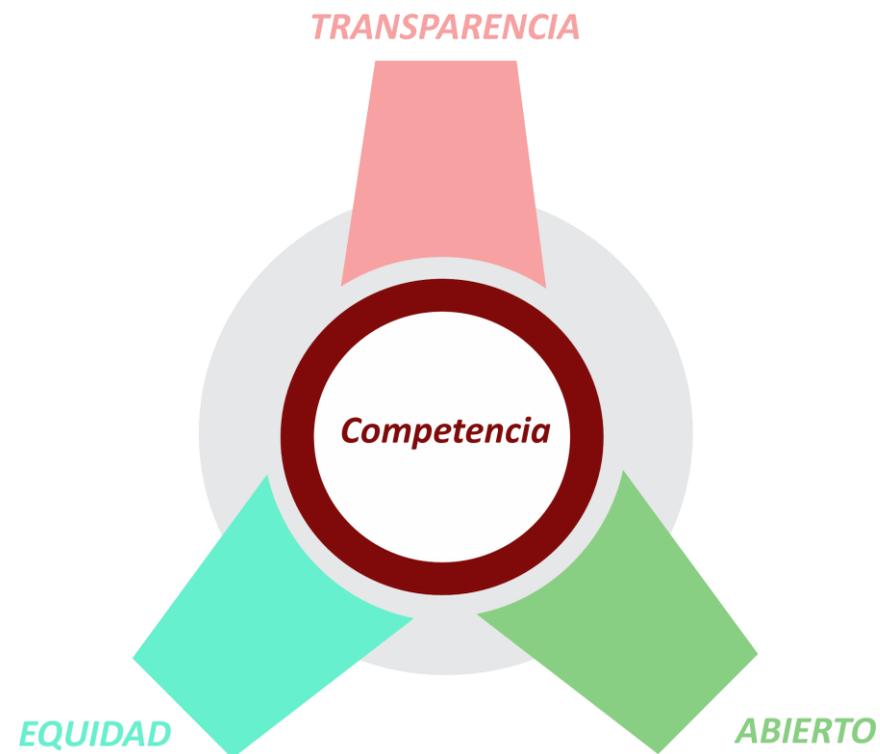

Garantizar la máxima competencia

Comunicación constante, mediante sesiones informativas


Procedimientos de selección que promuevan competencia y libre concurrencia.

Todas las empresas interesadas en participar tengan las mismas posibilidades de éxito


El Objetivo es obtener la oferta más ventajosa y adecuada para realizar los trabajos.

ETAPAS DEL PROCESO DE PROCURA


Para el proceso de procura se tienen 03 grandes etapas:

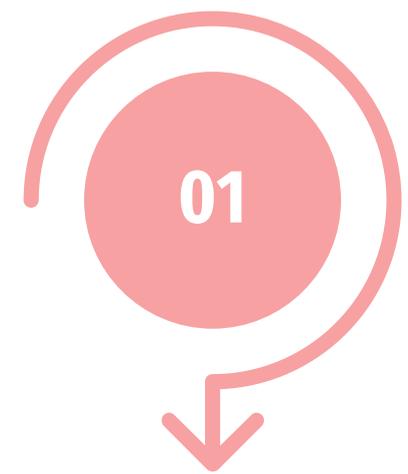



**REGISTRO DE INTERÉS
DE POSTORES**



**Registro Virtual
Ilimitado**

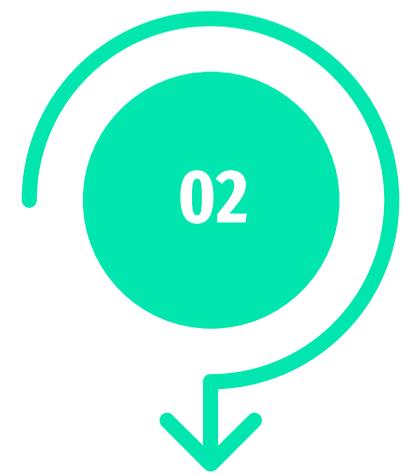

**ETAPA DE
PRECALIFICACIÓN**



**ETAPA INVITACIÓN
A LICITAR**



**Postores Precalificados
Finalistas**

=



PROCESO DE CONTRATACIÓN

Etapa 1 – Registro de Interés

- ✓ Se ha habilitado en el portal de licitaciones de BRH desde el día de hoy 28/09/2023 <https://drenajepluvialsullana.com/licitaciones>, el link para el “Registro de Interés”, el cual deberá ser completado por las empresas constructoras interesadas en participar en el proceso de licitación.
- ✓ El registro es ilimitado y estará activo por 20 días calendario.
- ✓ A las 48 horas de realizado el registro, las empresas recibirán el documento de Declaración de Confidencialidad.

A screenshot of a web browser showing the 'REGISTRO DE INTERÉS' form. The page has a dark red header with the ROGGIO Perú logo and a 'RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIO' logo. The main content is white with black text. It includes instructions for registration, a list of questions, and a section for 'INFORMACIÓN GENERAL' with radio button options for construction value ranges: 0-50 millones, 50-100 millones, and 100-150 millones. The background of the page shows an aerial view of a city.

Código QR:



PROCESO DE CONTRATACIÓN

Etapa 2 – Precalificación

- ✓ Se enviará el “**Cuestionario de Precalificación**” a aquellas empresas que hayan cumplido con realizar su “**Registro de Interés**”. Las respuestas al “Cuestionario de Precalificación” tienen carácter de Declaración Jurada.
- ✓ Documentos e información clave que serán evaluados:
 - Información General del Postor interesado
 - Estados Financieros de los últimos tres (3) años
 - Políticas y Procedimientos de medio ambiente
 - Políticas y Procedimientos de gestión de la calidad
 - Certificación y Política de salud y seguridad
 - Cumplimiento de Ética
 - Contar con equipos propios o capacidad de arrendamiento
 - Experiencia en Obras Similares



PROCESO DE CONTRATACIÓN

Etapa 3 – Invitación a licitar

- ✓ En esta etapa los postores que hayan sido **precalificados** recibirán las “Bases de Licitación” y “Términos de Referencia” para que puedan emitir sus propuestas técnicas y económicas según el calendario del proceso.
- ✓ En esta etapa se realizará la evaluación de las ofertas considerando criterios que privilegian la metodología, planes de trabajo e innovación.
- ✓ La revisión y evaluación de la documentación técnica y económica, se realizará conjuntamente con la ARCC.

PROPUESTA TÉCNICA

- ✓ Evaluación de Seguridad
- ✓ Evaluación de Calidad
- ✓ Personal clave
- ✓ Plan de trabajo
- ✓ Cronograma

PROPUESTA ECONÓMICA

- ✓ Evaluación de Económica y comercial
- ✓ Evaluación de Garantías



CALENDARIO DE LICITACIÓN



NOTA: Esta información puede ser actualizada de acuerdo al desarrollo del Proyecto

Registro de Interés

ROGGIO Perú
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

REGISTRO DE INTERÉS

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. SUCURSAL DEL PERU se encuentra en el proceso de convocatoria para la Licitación del PAQUETE DE CONSTRUCCIÓN N°01 DEL PROYECTO: "ENTREGA DEL DRENAJE PLUVIAL INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SULLANA BELLAVISTA (PAQUETE D09)".

Para registrar su interés en este proceso debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Completar el cuestionario indicando el monto de la Obra en el que desean participar.
2. Después de haber llenado y enviado el cuestionario de Registro de Interés, se enviará el "Formulario de Precalificación" en un plazo no mayor a 24 horas.

Puedes visualizar las Licitaciones asociadas a este proyecto en nuestro portal de licitaciones, al igual que el cronograma para la precalificación de las obras de construcción: <https://drenajepluvialsullana.com/>

Hola, Raphael Sebastián, Cuando envíe este formulario, el propietario verá su nombre y dirección de correo electrónico.

* Obligatorio

INFORMACIÓN GENERAL

1. Pregunta *

- Obras de construcción de 0 - 50 millones
- Obras de construcción de 50 - 100 millones
- Obras de construcción de 100 - 150 millones

Código QR:



Las consultas podrán ser enviadas al correo de informes.sullana@roggio.com.pe, las que serán atendidas en nuestro portal de licitaciones.

www.drenajepluvialsullana.com

 **Benito Roggio Peru**

¡Gracias por su participación!



ROGGIO | Perú
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

www.drenajepluvialsullana.com

Registro de Interés



ROGGIO Perú
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

REGISTRO DE INTERÉS

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. SUCURSAL DEL PERU se encuentra en el proceso de convocatoria para la Licitación del PAQUETE DE CONSTRUCCIÓN N°01 DEL PROYECTO: "ENTREGA DEL DRENAJE PLUVIAL INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SULLANA BELLAVISTA (PAQUETE D05)"

Para registrar su interés en este proceso debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Completar el cuestionario indicando el monto de la Obra en el que desean participar.
2. Después de haber llenado y enviado el cuestionario de Registro de Interés, se enviará el "Formulario de Precalificación" en un plazo no mayor a 24 horas.

Puedes visualizar las Licitaciones asociadas a este proyecto en nuestro portal de licitaciones, al igual que el cronograma para la precalificación de las obras de construcción: <https://drenajepluvialsullana.com/>

Hola, Raphael Sebastian, Cuando envíe este formulario, el propietario verá su nombre y dirección de correo electrónico.

* Obligatorio

INFORMACIÓN GENERAL

1. Pregunta *

Obras de construcción de 0 - 50 millones

Obras de construcción de 50 - 100 millones

Obras de construcción de 100 - 150 millones

Código QR:



Las consultas podrán ser enviadas al correo de informes.sullana@roggio.com.pe, las que serán atendidas en nuestro portal de licitaciones.

www.drenajepluvialsullana.com

 **Benito Roggio Peru**
